


Thomas Betong Arbetsgång

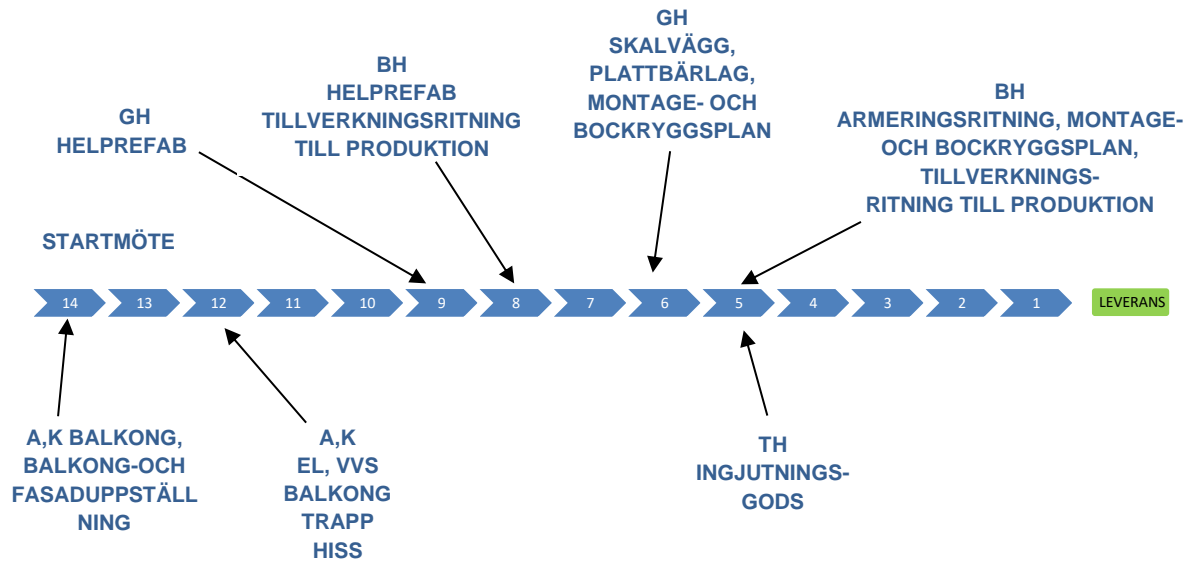

- 15 arbetsveckor innan leverans**
Leveranstidplan per produkt med byggnadsdel och vecka.
- 14 arbetsveckor innan leverans**
Underlag helprefab tillhanda Thomas Betong.
Balkong- och fasaduppställning samt K- och A-handlingar med mått och detaljer balkonger, loftgångar och terrasselement (när produkter levereras av Thomas Betong). **Se nästa sida för förtydligande.**
- 12 arbetsveckor innan leverans**
Underlag bjälklag och väggar tillhanda Thomas Betong.
K-, A-, balkong, trapp- och hissritningar för hela projektet i dwg-, ifc- och pdf- format.
Håltagningsunderlag från EL och VVS i dwg-format. **Se nästa sida för förtydligande.**
Information om tillhandahållet ingjutningsgods.
- 9 arbetsveckor innan leverans**
Thomas Betong skickar GH helprefab
- 8 arbetsveckor innan leverans**
Thomas Betong skickar BH helprefab
Tillverkningsritningar skickas till fabrik för produktion. Produktionsplanering i fabrik både enligt leveransplan och antal element per littera.
- 6 arbetsveckor innan leverans**
Thomas Betong skickar GH plattbärlag och skalväggar
Montageplaner, Bockryggsplaner och ev. Tillverkningsritningar. Om inga synpunkter erhålles inom en vecka uppdateras ritningarna till bygghandling per automatik.
- 5 arbetsveckor innan leverans**
Thomas Betong skickar BH plattbärlag och skalväggar
Armeringsritning samt bygghandling Montageplaner och Bockryggsplaner.
Tillhandahållna ingjutningsgods levereras till fabrik med tydlig märkning av projekt.

Thomas Betong Arbetsgång - underlag

Konstruktionshandlingar (BH)

- Föreskrifter med lastförutsättningar och exponeringsklasser.
- Planer (dwg och pdf) med bjälklagstjocklekar, bjälklagskanter, placering pelare, balkar och bärande väggar samt större håltagningar.
- Sektioner med plushöjder.
- Bjälklags- och väggtyper med dimensioner och uppbyggnad.
- Detaljer på anslutningar med andra konstruktionsdelar (t ex balk, helprefab, pelare, storlekar på toppplåtar och plattbärlagskant vid utfackningsvägg med valvastängare.
- Detaljer balkonger, loftgångar och terrasselement (när produkter levereras av Thomas Betong).
- Laster som reaktionskrafter vid anslutande konstruktionsdelar som tak, balkupplag, HD/f och pelare.
- Samordnat projektkoordinatsystem samt stomlinjer.

Arkitekthandlingar (BH)

- Planer (dwg och pdf) med rumsbeskrivningar för lastförutsättningar.
- Balkonguppställning samt placering av fästen för balkongräcke (när produkter levereras av Thomas Betong).
- Fasaduppställning
- Samordnat projektkoordinatsystem samt stomlinjer.

Trapphandlingar (BH)

- Detaljer med bjälklagskanter, anslutande armering och placering av hål i vägg för infästning av trappa.

Hisshandlingar (BH)

- Detaljer med bjälklagskanter.
- Sektioner med placering (plushöjder) av ankarskenor

Håltagningsunderlag (BH)

- Håltagningsunderlag från EL och VVS för **plattbärlag** i dwg-format enligt Thomas Betongs symbolmall.
- Håltagningsunderlag från EL för **skalväggar** enligt Thomas Betong el-nyckel.
- Håltagningsunderlag från VVS för **skalväggar**. Markeras på plan med plushöjd och storlek. Plushöjd till centrum för cirkulära hål och plushöjd till uk vid rektangulära hål.

Kund

- Checklista vid startmöte där vi går igenom exempelvis, krankapacitet, placering räckesfästen och plåtavstängare.
